TAMOIOS

Inicio: 18/04/2015
Término: 17/12/2020

CRONOGRAMA EXECUTIVO DO TRECHO DE SERRA SP-099 PARA A IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO PRINCIPAL

Revisão 07
Novembro/2016

ITEM DE SERVIÇO	Itens EAP	DESCRITIVO DE OBRAS	KM INÍCIO	KM TÉRMINO	PREVISTO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE TÉRMINO DA OBRA
1	1	PROJETO					
		Projeto Executivo / Topografia / Sondagem			Aprovado	18/04/15	17/12/16
					Proposto	18/04/15	17/12/16
2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		Serviços Preliminares - Execução			Aprovado	18/10/15	17/04/19
					Proposto	18/11/15	17/06/19
3	3	CANTEIRO DE OBRA					
		Canteiros de Obra - Instalação/ Reforma / Ampliação / Operação e Manutenção / Desmobilização			Aprovado	18/04/15	17/04/20
					Proposto	18/04/15	17/04/20
4	5	CAMINHOS DE SERVIÇO					
		Caminhos de Serviço			Aprovado	18/10/15	17/11/16
					Proposto	18/11/15	17/06/17
		Caminho de Serviço 01 880m			Aprovado	18/01/16	17/10/16
					Proposto	30/01/16	17/06/17
		Caminho de Serviço 02 595m			Aprovado	18/12/15	17/11/16
					Proposto	30/11/16	17/06/17
		Caminho de Serviço 03 536m			Aprovado	18/10/15	17/04/16
					Proposto	18/11/15	30/11/16
5	4 , 7 e 11	OAE					
		Obras de Arte Especiais			Aprovado	18/10/15	17/03/20
					Proposto	18/12/15	17/12/20
		Ponte Paraibuna	61,58	61,83	Aprovado	18/11/15	17/11/17
					Proposto	18/02/16	17/12/17
		Viaduto retorno Km 62	62,00	62,00	Aprovado	18/12/15	17/04/16
					Proposto	18/01/17	17/09/17
		Viaduto 1	68,33	68,44	Aprovado	18/12/18	17/02/20
					Proposto	18/12/18	17/02/20
		Viaduto 1A	68,49	68,58	Aprovado	18/01/18	17/01/20
					Proposto	18/03/19	17/05/20
		Viaduto 2	69,59	69,74	Aprovado	18/12/16	17/02/20
					Proposto	18/10/17	17/02/20
		Viaduto 3	69,88	70,19	Aprovado	18/04/17	17/03/20
					Proposto	18/07/17	17/03/20
		Viaduto 4	75,84	76,09	Aprovado	18/11/17	17/04/19
					Proposto	18/08/18	17/10/19
		Viaduto 5	76,21	76,58	Aprovado	18/05/16	17/04/19
					Proposto	18/12/17	17/10/20
		Viaduto 6	80,39	81,34	Aprovado	18/10/15	17/07/19
					Proposto	18/12/15	17/07/19
		Viaduto 7	EST 131+000		Aprovado	18/11/17	17/09/19
					Proposto	18/01/17	17/10/19
		Viaduto 8	65,92		Aprovado	18/07/17	17/11/19
					Proposto	18/07/16	17/04/20
		Pontilhão	73,51	73,58	Aprovado	18/04/19	17/03/20
					Proposto	18/01/20	17/12/20
6	4, 6, 8, 11 e 12	TRECHOS					
		Lote 01 Km 60,48 ao 64,40	60,48	64,4	Aprovado	18/10/15	17/05/18
					Proposto	18/12/15	17/06/18
		Trecho 01	60,48	61,58	Aprovado	18/10/16	17/09/17
					Proposto	18/11/16	17/03/18
		Trecho 02	61,83	63,74	Aprovado	18/04/16	17/12/17
					Proposto	18/12/15	17/01/18
		Trecho 12 - Retorno Km 62	62,00		Aprovado	18/10/15	17/05/16
					Proposto	18/12/15	17/01/18
		Trecho 03	63,74	64,40	Aprovado	18/01/16	17/05/18
					Proposto	18/12/15	17/06/18
		Lote 02 Km 64,40 ao Túnel 01	64,40	65,44	Aprovado	18/01/16	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 04	64,40	65,44	Aprovado	18/01/16	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 13- Retorno Km 65,9	65,92 Pista Existente		Aprovado	18/10/17	17/04/20
					Proposto	18/05/18	17/12/20
		Trecho 17 - Navidade da Serra	65,92 Pista Existente	67,87 Pista Existente	Aprovado	18/09/17	17/04/20
					Proposto	18/06/18	17/12/20
		Trecho 14 - Ramo 100	100+0,000 EST	169+14,035 EST	Aprovado	18/06/16	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 15 - Ramo 200	200+0,000 EST	240+0,708 EST	Aprovado	18/05/17	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 16 - Ramo 400	400+0,000 EST	441+1,000 EST	Aprovado	18/09/17	17/04/20
					Proposto	EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO	
		Lote 03 Fim Túnel 1 ao Túnel 2	68,29	68,59	Aprovado	18/11/18	17/04/20
					Proposto	18/02/19	17/12/20
		Trecho 05	68,29	68,59	Aprovado	18/11/18	17/04/20
					Proposto	18/02/19	17/12/20
		Lote 04 Fim Túnel 2 ao Túnel 3	69,29	70,37	Aprovado	18/04/16	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 06	69,29	69,59	Aprovado	18/04/16	17/04/20
					Proposto	18/04/17	17/12/20
		Trecho 07	69,74	69,88	Aprovado	18/07/16	17/04/20
					Proposto	18/12/18	17/12/20
		Trecho 08	70,19	70,37	Aprovado	18/04/16	17/04/20
					Proposto	18/07/17	17/12/20
		Lote 05 Fim do Túnel 4 ao Túnel 5	76,09	76,71	Aprovado	18/05/16	17/04/20
					Proposto	18/06/17	17/12/20
		Trecho 09	76,09	76,21	Aprovado	18/05/16	17/04/20
					Proposto	18/05/18	17/12/20
		Trecho 10	76,58	76,71	Aprovado	18/07/16	17/04/20
					Proposto	18/06/17	17/12/20
		Lote 06 Fim do Túnel 5 ao Km 82	81,34	81,96	Aprovado	18/10/15	17/04/20
					Proposto	18/04/16	17/12/20
		Trecho 11	81,34	81,96	Aprovado	18/10/15	17/04/20
					Proposto	18/04/16	17/12/20
7	9	OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA					
		Obras de Contenção Geotécnica			Aprovado	18/11/15	17/01/20
					Proposto	18/12/15	17/08/20
		Trecho Planalto Km 62 retorno	62,00		Aprovado	18/11/15	17/05/16
					Proposto	18/01/16	17/09/16
		Trecho Planalto Km 64	65,00		Aprovado	18/01/16	17/10/16
					Proposto	EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO	
		Trecho de Acesso ao Bairro Alto da Serra	65,90		Aprovado	18/10/17	17/06/18
					Proposto	EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO	
		Interligação Ramo 100	65,00		Aprovado	18/05/17	17/05/18
					Proposto	EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO	
		Interligação Ramo 200	65,60		Aprovado	18/05/17	17/04/18
					Proposto	EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO	

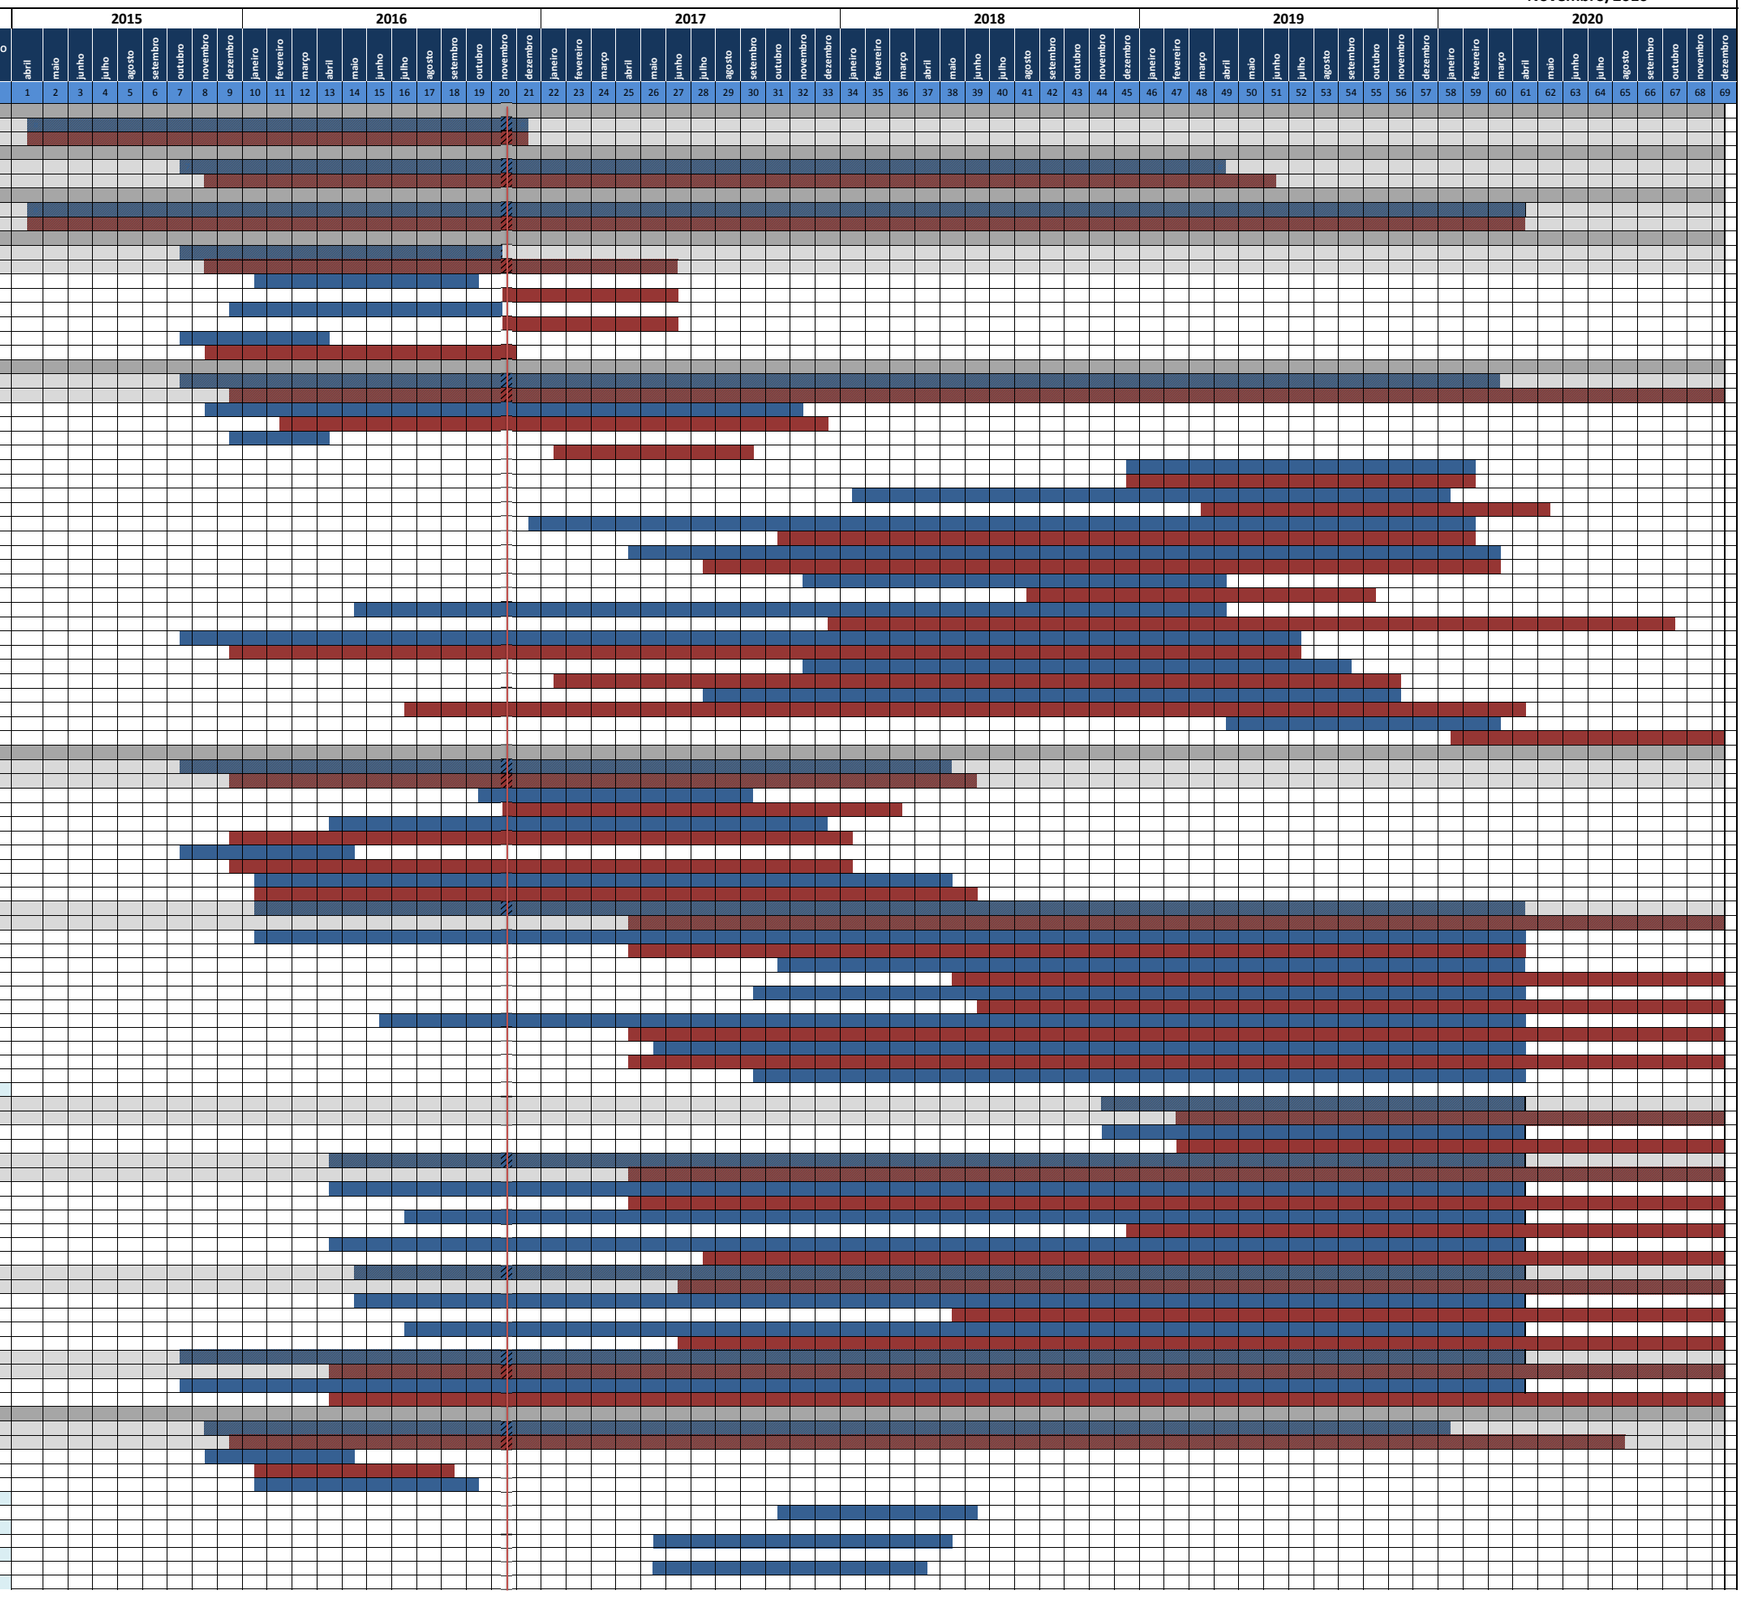

TAMOIOS

Inicio: 18/04/2015
Término: 17/12/2020

CRONOGRAMA EXECUTIVO DO TRECHO DE SERRA SP-099 PARA A IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO PRINCIPAL

Revisão 07
Novembro/2016
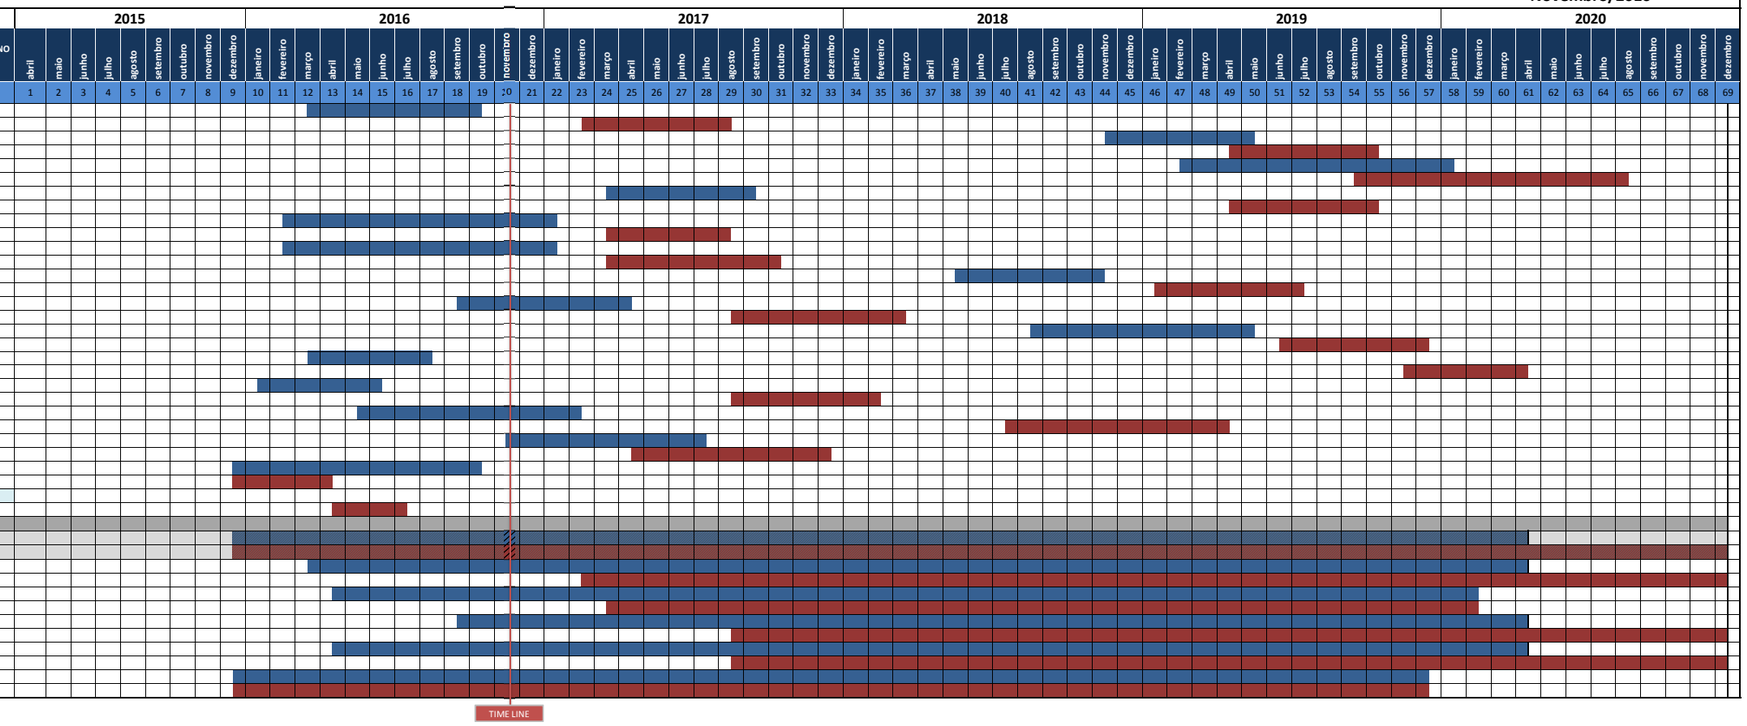
ITEM DE SERVIÇO	Itens EAP	DESCRITIVO DE OBRAS	KM INÍCIO	KM TÉRMINO	PREVISTO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE TÉRMINO DA OBRA
		Emboque T1 - SJC	65,20		Aprovado	18/03/16	17/10/16
					Proposto	18/02/17	17/08/17
		Viaduto V1 e 1A	68,20		Aprovado	18/11/18	17/05/19
					Proposto	18/04/19	17/10/19
		Emboque T1 - Caragua	68,20		Aprovado	18/02/19	17/01/20
					Proposto	18/09/19	17/08/20
		Emboque T2 - SJC	68,20		Aprovado	18/03/17	17/09/17
					Proposto	18/04/19	17/10/19
		Emboque T2 - Caragua	68,20		Aprovado	18/02/16	17/01/17
					Proposto	18/03/17	17/08/17
		Fim do Túnel 02 ao Viaduto 02	68,60		Aprovado	18/02/16	17/01/17
					Proposto	18/03/17	17/10/17
		Viaduto 02 ao Viaduto 03	69,60		Aprovado	18/05/18	17/11/18
					Proposto	18/01/19	17/07/19
		Emboque T3 - SJC	70,20		Aprovado	18/09/16	17/04/17
					Proposto	18/08/17	17/03/18
		Emboque T3 - Caragua	73,40		Aprovado	18/08/18	17/05/19
					Proposto	18/06/19	17/12/19
		Emboque T4 - SJC	73,40		Aprovado	18/03/16	17/08/16
					Proposto	18/11/19	17/04/20
		Emboque T4 - Caragua	75,80		Aprovado	18/01/16	17/06/16
					Proposto	18/08/17	18/02/18
		Viadutos 04 e 05	76,00		Aprovado	18/05/16	17/02/17
					Proposto	18/07/18	17/04/19
		Emboque T5 - SJC	76,60		Aprovado	18/11/16	17/07/17
					Proposto	18/04/17	17/12/17
		Emboque T5 - Caragua	80,40		Aprovado	18/12/15	17/10/16
					Proposto	18/12/15	17/04/16
		Caminho de Serviço 3	80,40		Aprovado	NÃO EXISTIA	
					Proposto	18/04/16	17/07/16
8	4, 10 e 13	TÚNEIS					
		Túneis			Aprovado	18/12/15	17/04/20
					Proposto	18/12/15	17/12/20
		TÚNEL 1 - 1 FRENTE - 2850M	65,44	68,29	Aprovado	18/03/16	17/04/20
					Proposto	18/02/17	17/12/20
		TÚNEL 2 - 1 FRENTE - 700M	68,59	69,29	Aprovado	18/04/16	17/02/20
					Proposto	18/03/17	17/02/20
		TÚNEL 3 - 1 FRENTE - 3135M	70,37	73,51	Aprovado	18/09/16	17/04/20
					Proposto	18/08/17	17/12/20
		TÚNEL 4 - 1 FRENTE - 2260M	73,58	75,84	Aprovado	18/04/16	17/04/20
					Proposto	18/08/17	17/12/20
		TÚNEL 5 - 2 FRENTES - 3675M	76,71	80,39	Aprovado	18/12/15	17/12/19
					Proposto	18/12/15	17/12/19
